



Beschlussvorlage 2016/317	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Schlossausschuss	06.10.2016	öffentlich

Wittelsbacher Schloss Friedberg;
- Sachstandsbericht zum Baufortschritt und zur Kostenentwicklung-

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung und des Planungsteams zum Baufortschritt sowie zur aktuellen Kostenentwicklung wird zur Kenntnis genommen.


anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Termine - Baufortschritt

Rahmenterminplan BA1b / BAII (Stand 09/2016)

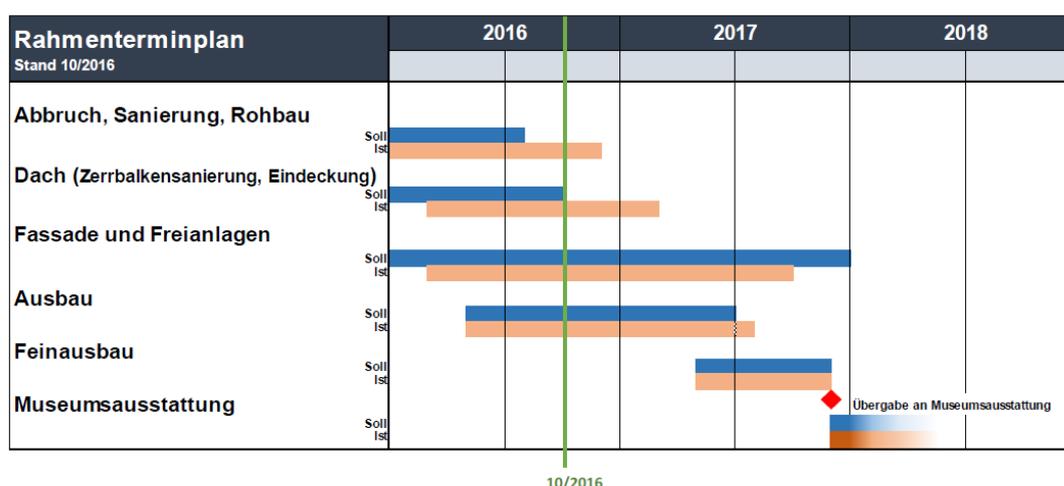

:



Kosten

Gesamtübersicht (Stand 09/2016)

	Status	Kostenprognose nach Verschiebung Bauabschnitte
BA Ia	✓	0,869 Mio. €
BA Ib + BA II	○	12,588 Mio. €
Summe brutto		13,457 Mio. €
Ausbau Museum	○	1,050 Mio. €
Nebenkosten	○	5,202 Mio. €
Summe brutto		19,709 Mio. €

=> Die **Kostenobergrenze** von 19,73 Mio. € brutto **kann** aus derzeitiger Sicht **eingehalten** werden.






Kosten

Gesamtübersicht – BA Ib + BA II (Stand 09/2016) – inkl. freie Mittel BA Ia

Kostenübersicht

Summen in T € Brutto

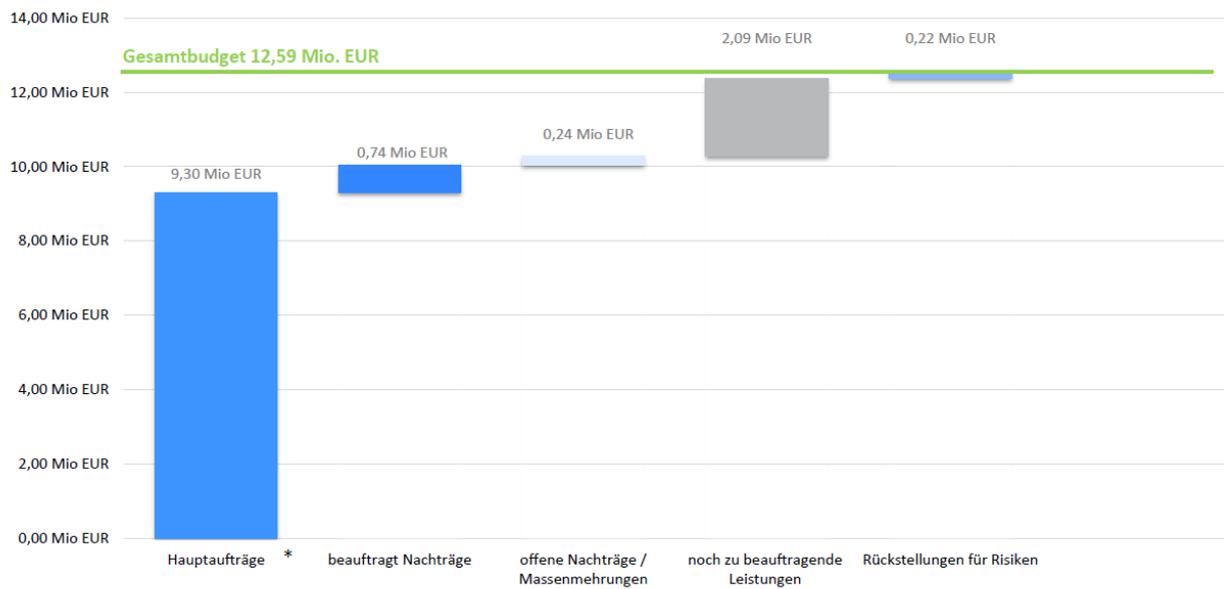

*inkl. Vergabe VE 617, 644

DREES & SOMMER
