



Beschlussvorlage 2016/199	Referat	Baureferat
	Abteilung	Abt. 30, Baureferat
	Verfasser(in)	

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Schlossausschuss	22.06.2016	öffentlich

**Wittelsbacher Schloss Friedberg;
-Sachstandsbericht zum Baufortschritt und zur Kostenentwicklung-**

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung und des Planungsteams zum Baufortschritt sowie zur aktuellen Kostenentwicklung wird zur Kenntnis genommen.


anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Termine - Baufortschritt

Rahmenterminplan BA1b / BA1I (Stand 06/2016)

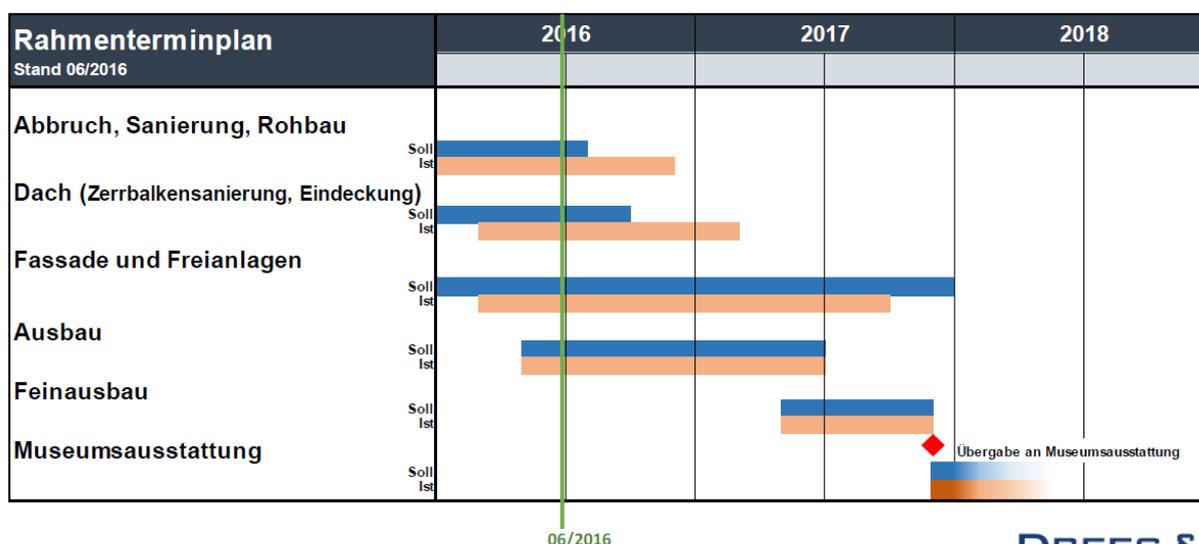

DREES & SOMMER

Kosten

Gesamtübersicht (Stand 06/2016)

	Status	Kostenprognose nach Verschiebung Bauabschnitte
BA Ia	✓	0,869 Mio. €
BA Ib + BA II	○	12,595 Mio. €
Summe brutto		13,464 Mio. €
Ausbau Museum	○	1,050 Mio. €
Nebenkosten	○	5,155 Mio. €
<u>Summe brutto</u>		<u>19,669 Mio. €</u>


=> Die **Kostenobergrenze** von 19,73 Mio. € brutto **kann** aus derzeitiger Sicht **eingehalten** werden.

DREES & SOMMER



Kosten

Gesamtübersicht – BA Ib + BA II (Stand 06/2016) – inkl. freie Mittel BA Ia

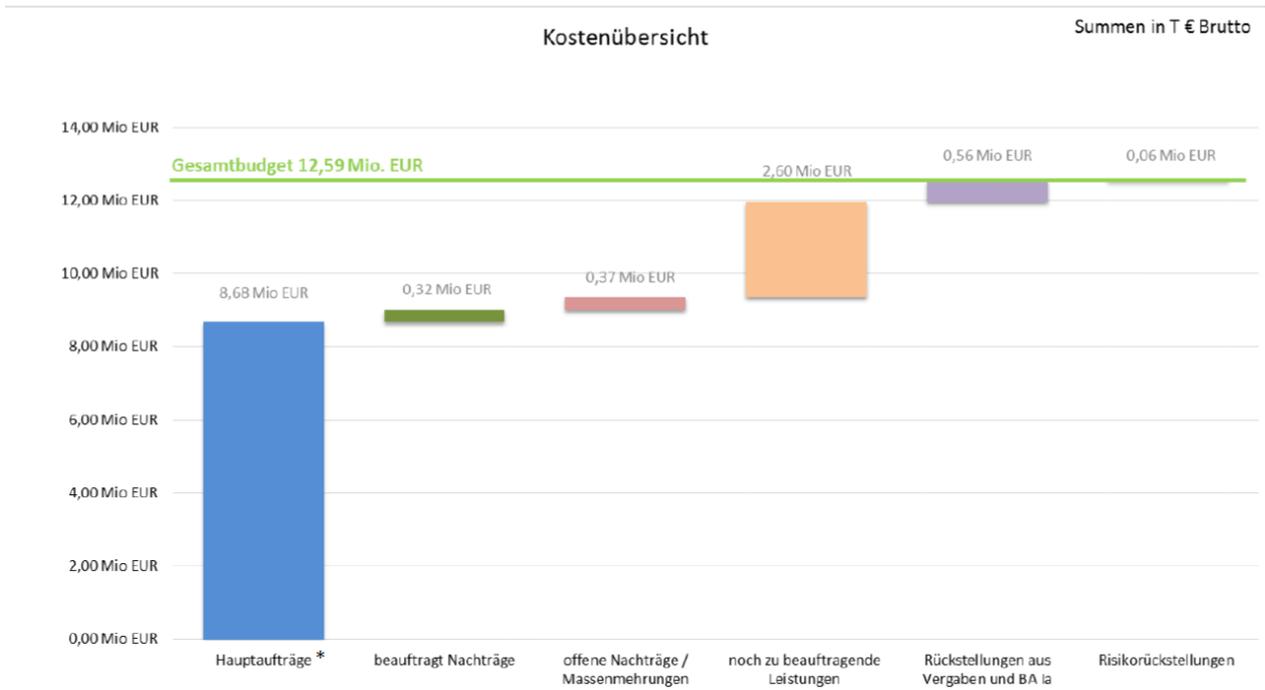

*inkl. Vergabe VE601 Estrich

**DREES &
SOMMER**
