


# Burgwallstraße 5

Entwurfsplanung Besucherempfang Landesausstellung 2020


Friedberg, 07.05.2019, 8:30 Uhr




# Lageplan

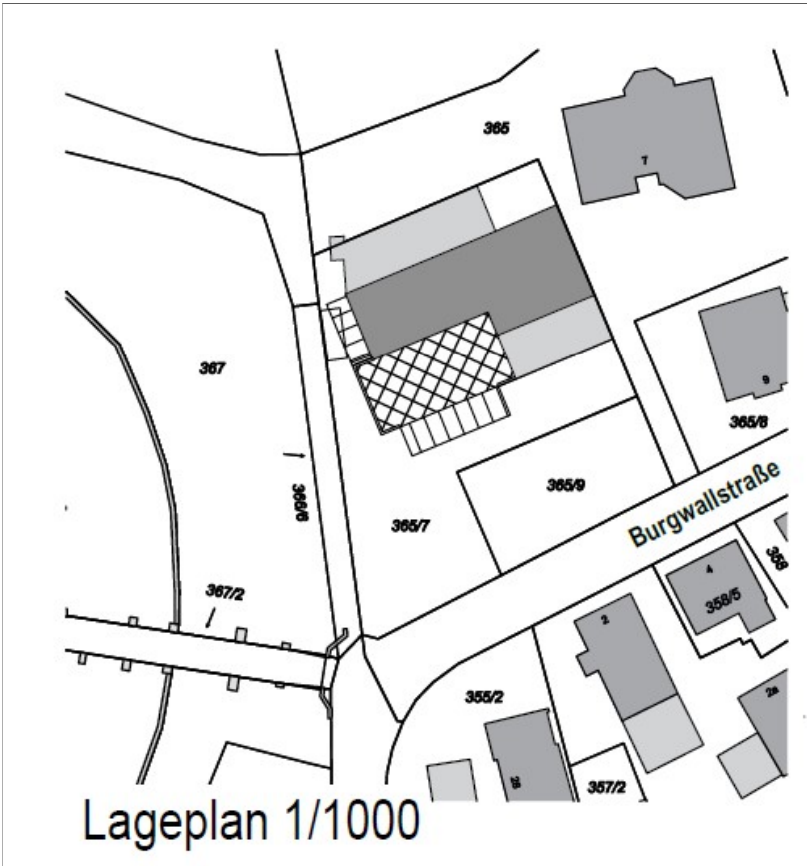

# Entwurfsplanung | Grundriss EG

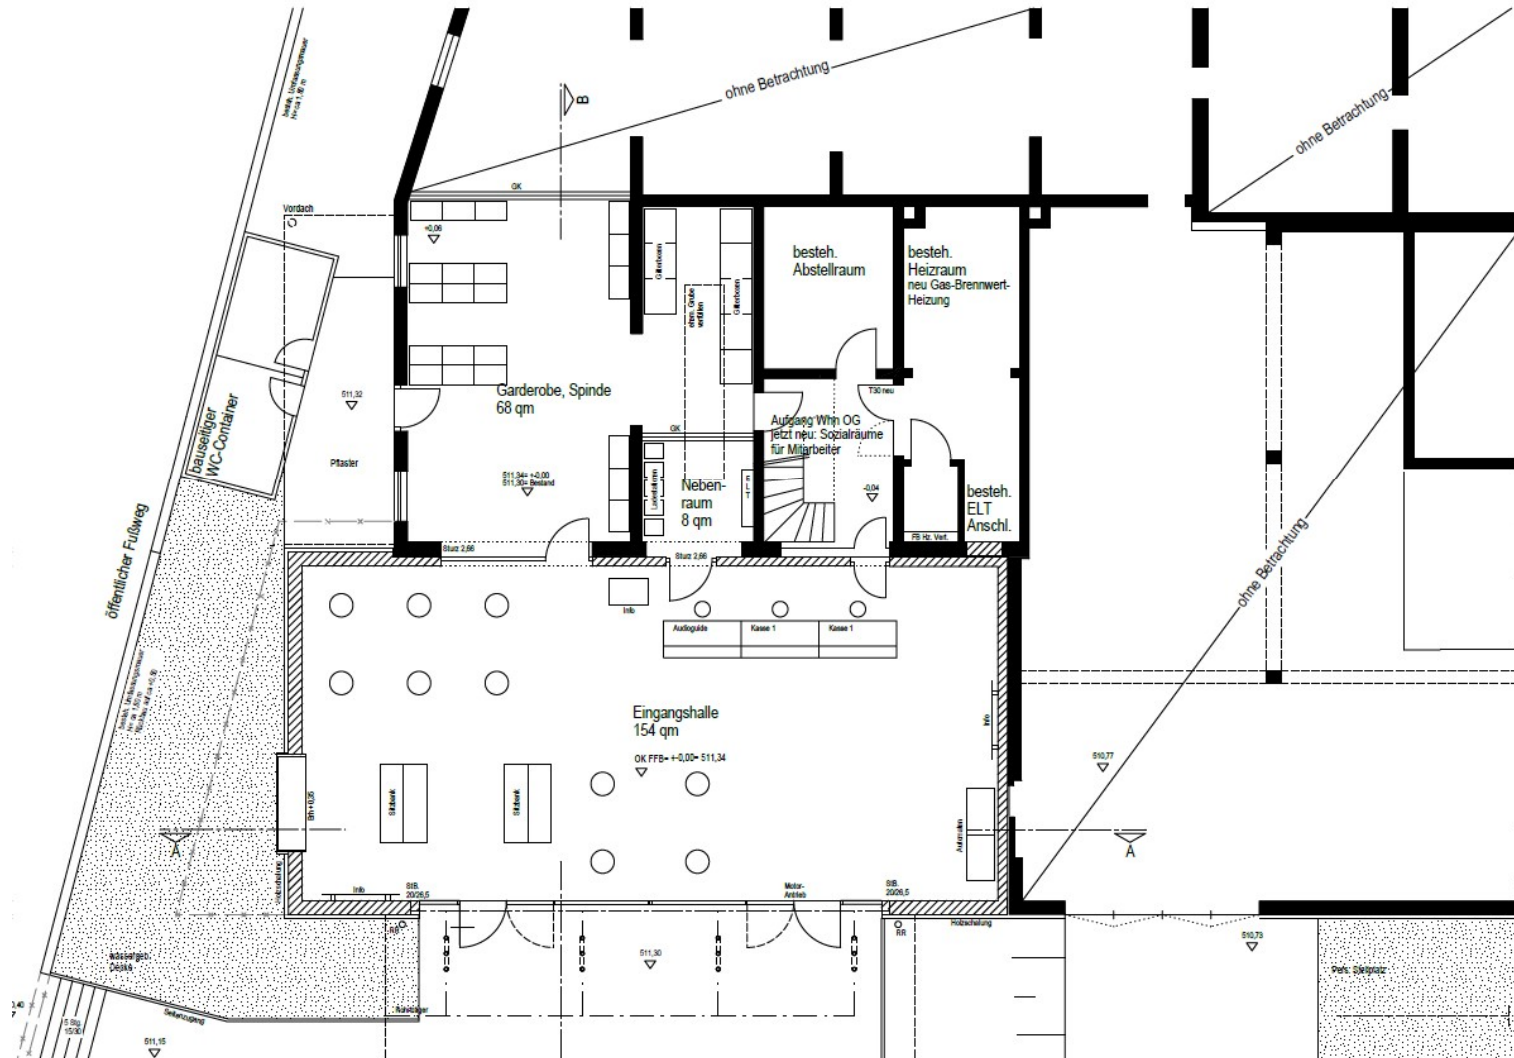


# Entwurfsplanung | Grundriss OG

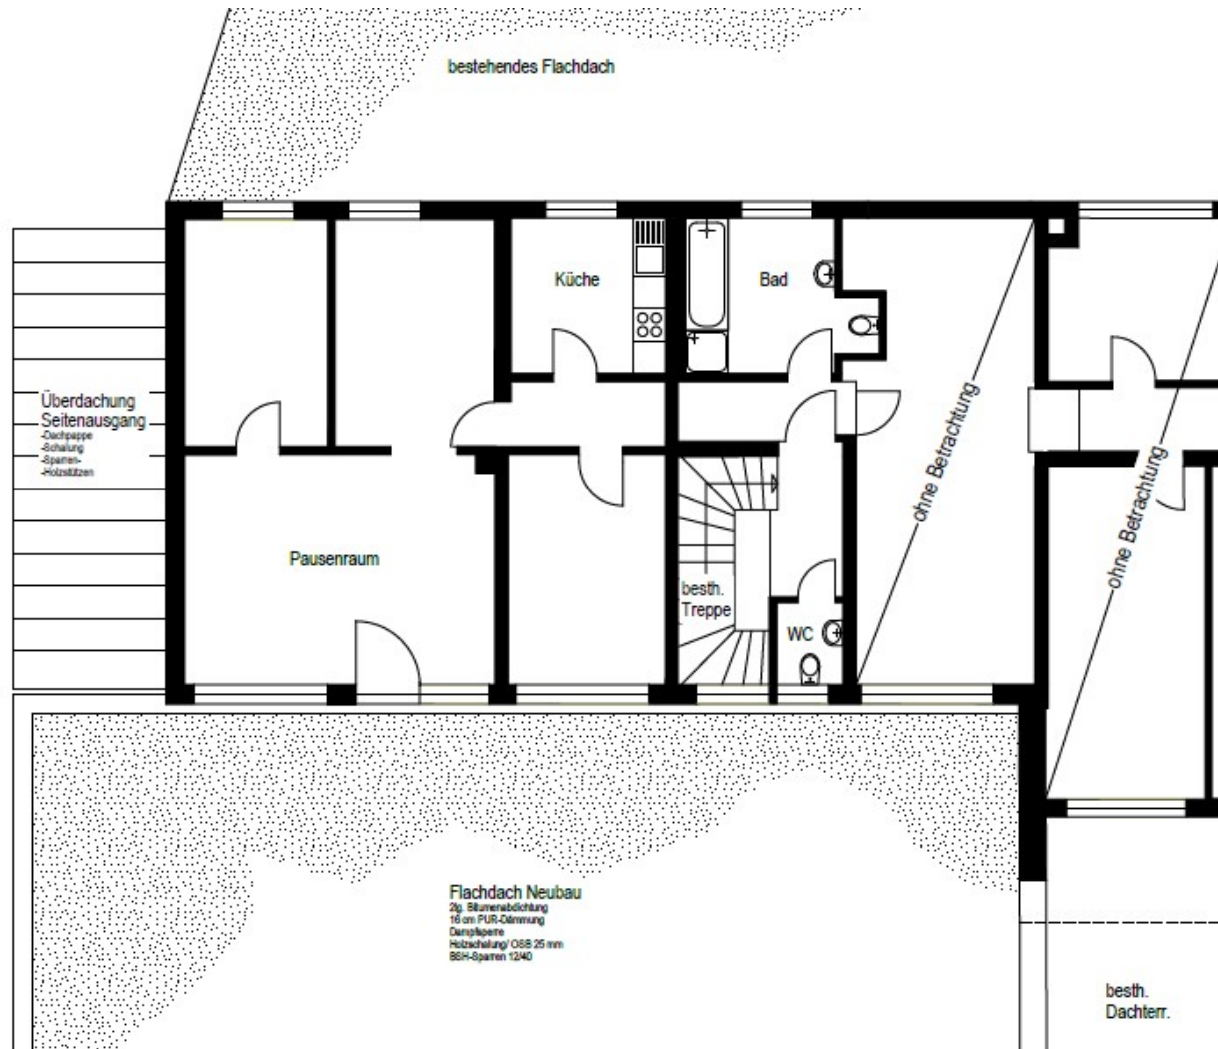


Entwurfsplanung | Ansicht Süden



Entwurfsplanung | Ansicht Westen

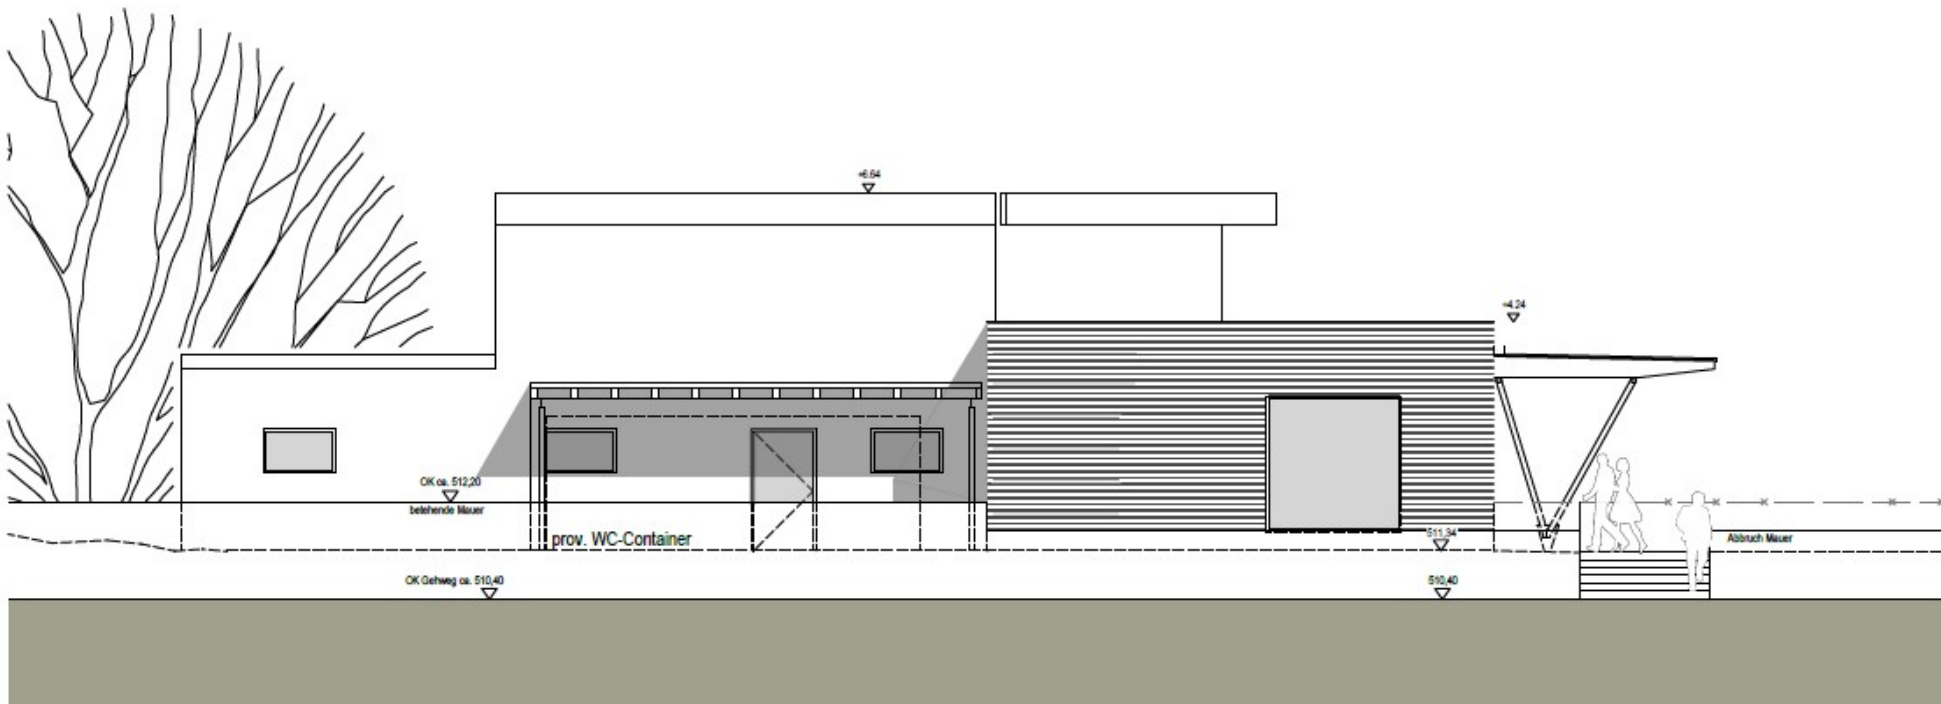

# Entwurfsplanung | Schnitt B-B (Nord-Süd)

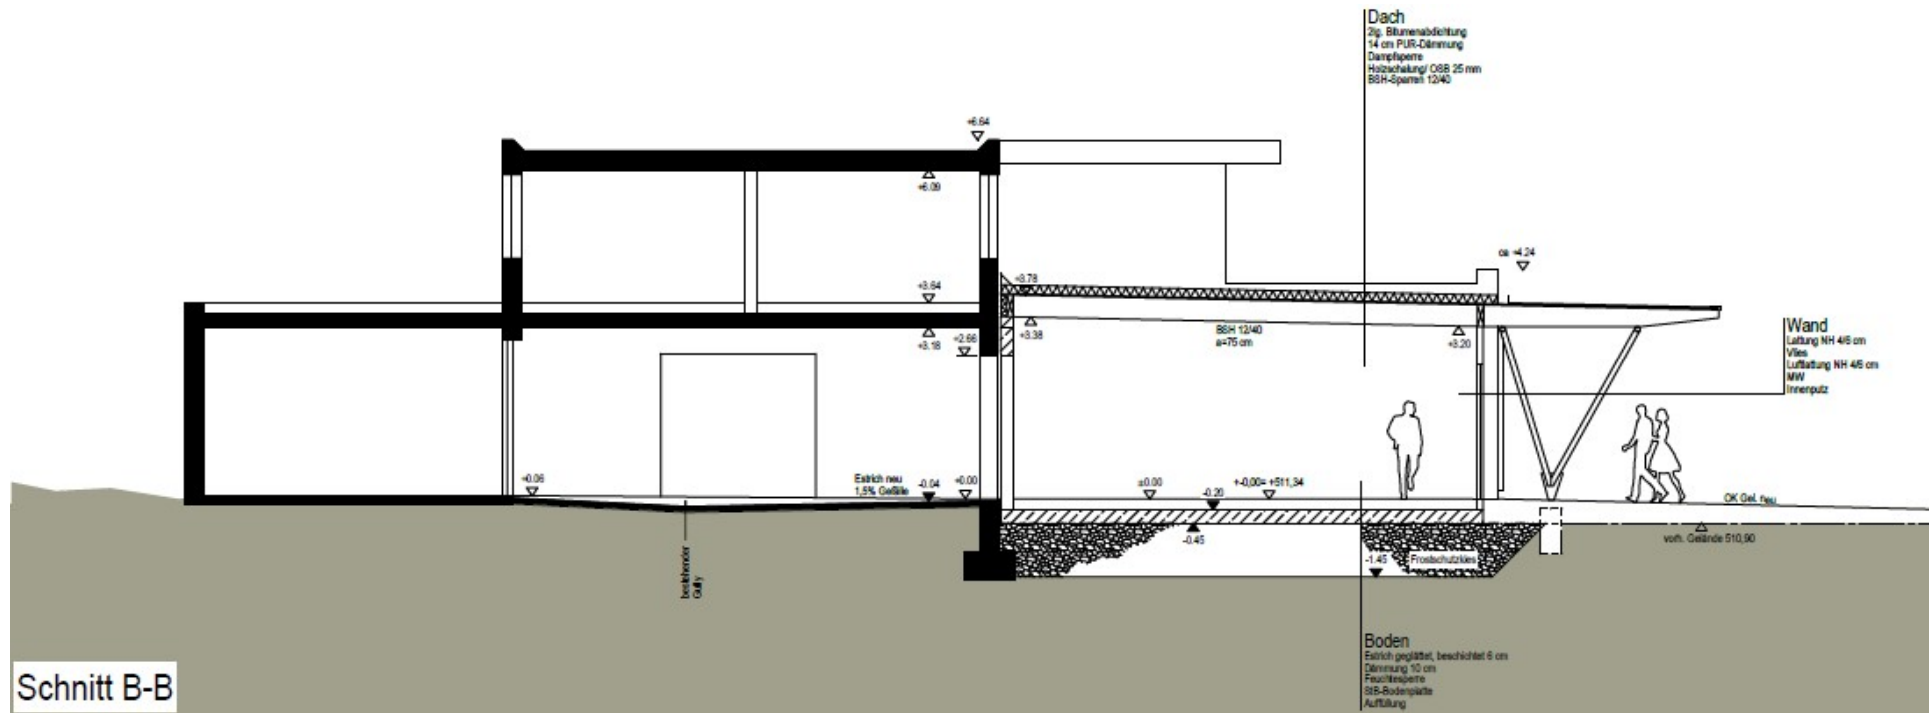

# Ablaufplan / Bau-Leistungen des städtischen Baubetriebshof

|                                                            | SEPT |    |    |    | OKT |    |    |    | NOV |    |    |    | Dez 19 |    |    |    | Jan 20 |    |    |    | FEB |    |    |    | MÄRZ |    |    |    | APR |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
|                                                            | 36   | 37 | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44  | 45 | 46 | 47 | 48     | 49 | 50 | 51 | 52     | 01 | 02 | 03 | 04  | 05 | 06 | 07 | 08   | 09 | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| sämtl. Abbruch-/<br>Rückbau Arbeiten<br>bauseites erledigt |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Erdarbeiten                                                |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Kanal                                                      |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Bodenplatte                                                |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Mauerwek                                                   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Ringanker                                                  |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Zimmererarbeiten                                           |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Dachabdichtung                                             |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Spengler                                                   |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Fenster/ Türen                                             |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Unterputz Install.                                         |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Innenputz                                                  |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Fassadenbekleidung                                         |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Estrich Abdicht/ Dä                                        |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| FB HZ                                                      |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Estrich                                                    |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Maler                                                      |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Einrichtung/ Beleucht.                                     |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Heizzentrale                                               |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| ELT -VT, Installation                                      |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
| Außenanlagen                                               |      |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |     |    |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |

| Leistung |                                        | Bauhof | Ausschreibung |
|----------|----------------------------------------|--------|---------------|
| KG 200   | Abbrucharbeiten                        | x      |               |
| KG 300   | Baukonstruktion                        |        |               |
| KG 300   | Baumeisterarbeiten                     | x      |               |
| KG 300   | Stahlbauarbeiten                       | x      |               |
| KG 300   | Zimmererarbeiten                       | x      |               |
| KG 300   | Dachabdichtung                         |        | x             |
| KG 300   | Schreinerarbeiten (Fenster & Türen)    |        | x             |
| KG 300   | Spenglerarbeiten                       |        | x             |
| KG 300   | Trockenbauarbeiten                     | x      |               |
| KG 300   | Malerarbeiten                          | x      |               |
| KG 300   | Gerüstarbeiten                         | x      |               |
| KG 400   | Technische Gebäudeausrüstung           |        |               |
| KG 411   | Abwasseranlagen                        | x      |               |
| KG 412   | Wasseranlagen                          | x      |               |
| KG 413   | Gasanlagen                             |        | x             |
| KG 420   | Wärmeversorgungsanlagen                | x      |               |
| KG 440   | Starkstromanlagen                      | x      |               |
| KG 450   | Fern- & Informationstechnische Anlagen | x      |               |
| KG 500   | Außenanlagen                           | x      |               |
| KG 600   | Ausstattung & Kunstwerke               |        | x             |
